

工事進捗状況

工 事 名 称	北海道大学学修支援施設（百年記念会館）改修工事
工 期	令和元年10月8日～令和2年3月19日
進 捗 状 況	令和元年12月28日現在 40%/53.3%（実施/予定）
	・ 仮設工事：外部足場（西、北、南）面組立
	・ コンクリート：1階テラス土間コン打設、耐震壁コン打設、その他ふかし壁コン打設
	・ 解体工事：2階事務室天井アスベスト除去、3階壁・天井アスベスト除去・1階躯体開口解体
	・ 塗装工事：外部鋼板面ウエザーコート処理

工 事 写 真




1階テラス土間コン打設完了



1階 耐震壁コン打設・グラウト注入完了



3階 ロックウール吹付完了

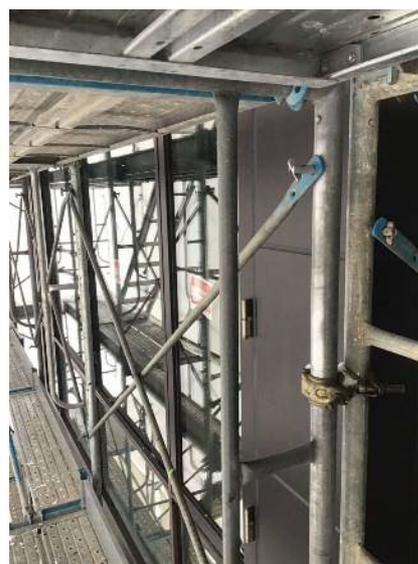

外部 ウエザーコート工法
