

工事進捗状況

工 事 名 称	北海道大学（札幌）胆振東部地震災害復旧（内壁等）工事	
工 期	令和元年9月10日～令和2年3月31日（変更）	
進 捗 状 況	令和2年2月28日現在	92.0%/92.0%（実施/予定）
	・ 共同研究棟	・ 空調設備取替工事施工前調査
	・ 中央キャンパス総合研究棟1号棟	・ 社内検査
	・ 書庫	・ 社内検査

工 事 写 真




共同実験棟 空調設備取替工事施工前調査



共同実験棟 空調設備取替工事施工前調査



中央キャンパス総合研究棟1号棟 社内検査

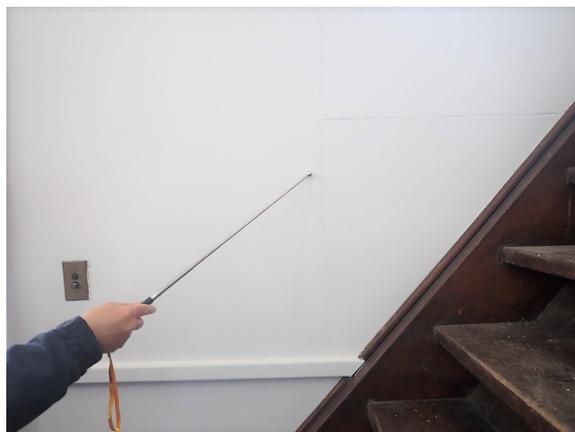

書庫 社内検査
